Proposta de Investimento

PRÉDIO RUA DO CLUBE · SANTA CLARA

Vale do Pinheiro · Coimbra · Portugal

Preparado para

Hugo Batista

Abril 2026

Proposta de Investimento

Rua do Clube · Vale do Pinheiro · Santa Clara, Coimbra

Preparado para: Hugo Batista

Fachada exterior · Rua do Clube 15, Santa Clara

SUMÁRIO EXECUTIVO

Valor de Aquisição	Valor de Venda Alvo	Retorno Total	Retorno Anualizado
185.000 €	**500.000 €**	**41.8%**	**41.8%**
100% capitais próprios	T3: 290.000 € + T1: 210.000 €	total investido	base 12 meses

Lucro Bruto Estimado	Lucro Líquido (IRC)	Total Investido	Prazo de Retenção
147.493 €	**117.994 €**	**352.507 €**	**12 meses**
	o	custos	itura de venda

SOBRE O PROJECTO

O projecto consiste na aquisição, remodelarão integral e revenda de um prédio composto por dois apartamentos independentes — um T3 no 1.º andar e um T1 no rés-do-chão — localizados na Rua do Clube, Santa Clara, Coimbra. O imóvel tem uma área bruta privativa total de 159 m² (T3: 54,5 m² registados + 50 m² não registados + T1: 54,5 m²), implantado num terreno de 359 m² com logradouro e acesso automóvel. Construído em 1979, o edifício beneficia de licença de habitação emitida pela Câmara Municipal de Coimbra (Alvará n.º 47/1979) e encontra-se num estado de conservação que exige remodelarão total, o que justifica o preço de aquisição abaixo do valor de mercado e cria a margem de valorização identificada.

IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO IMÓVEL

Localização	Rua do Clube 15 · Vale do Pinheiro · Santa Clara · Coimbra	**Artigo Matricial**	U-2083 · Serviço de Finanças 0728 Coimbra-1
Freguesia	União das Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas	**Titular Actual**	RL 10 Sport Lda (NIF 514071192)
Tipologia	Prédio com 2 frações independentes: T3 (1.º A) + T1 (R/C)	**Ano de Construção**	1979 · Alvará de Habitação n.º 47/1979 (CM Coimbra)
Área Bruta Privativa	159 m² (T3: 54,5 m² reg. + 50 m² n/reg. + T1: 54,5 m²)	**Área Total do Terreno**	359 m² (implantação: 95,8 m²)
VPT (CIMI)	76.580 € (T3: 42.040 € + T1: 34.540 €) · avaliado em 2024	**N.º de Pisos**	2 pisos · sem elevador

ESTADO ACTUAL — GALERIA FOTOGRÁFICA

Sala principal · R/C

Cozinha · R/C

Casa de banho · R/C

Sala principal · 1.º A

Quarto · 1.º A

Quarto · 1.º A

O imóvel apresenta acabamentos originais de 1979 e necessita de remodelarão completa. O estado de conservação abaixo do mercado é o principal motor de criação de valor neste investimento.

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

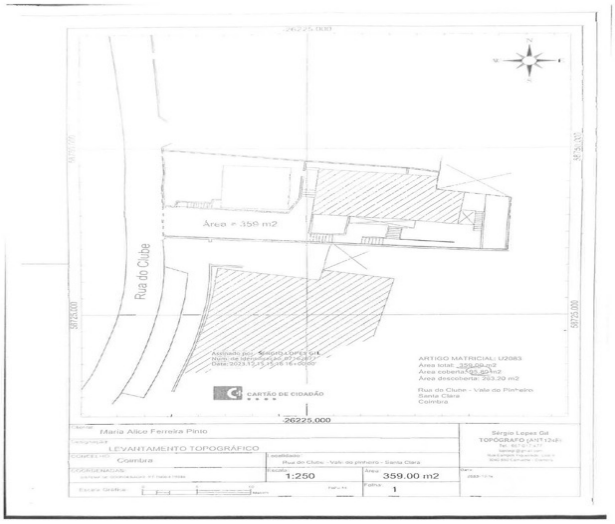

Levantamento Topográfico (1:250) · Artigo Matricial U2083 · Área total: 359 m² | Logradouro e acesso automóvel pela Rua do Clube

ESTUDO DE MERCADO — VALORES DE VENDA COMPARÁVEIS

T3 — 1.º Andar (54,5 m² + 50 m² não registados) · VVR alvo: 290.000 €

Ref.	Tipo	Área	Preço Anúncio	Preço/m²	Ajuste	Preço Aj./m²
#1	T3	110 m²	300.000 €	2.727 €	+8,75%	2.966 €
#2	T3	82 m²	254.000 €	3.098 €	+6,75%	3.307 €
#3	T3	119 m²	340.000 €	2.857 €	+6,00%	3.029 €
#4	T3	101 m²	299.500 €	2.965 €	+6,50%	3.158 €
#5	T3	128 m²	300.000 €	2.344 €	+18,25%	2.771 €
Média				**2.798 €**		**3.046 €**

Fonte: Idealista, Remax, Claro Imobiliária, LuxProperties · Ajuste pelo método comparativo

T1 — R/C (54,5 m²) · VVR alvo: 210.000 €

Ref.	Tipo	Área	Preço Anúncio	Preço/m²	Ajuste	Preço Aj./m²
#1	T1	44 m²	250.000 €	5.682 €	-22,5%	4.403 €
#2	T0/T1	32 m²	185.000 €	5.781 €	-20,5%	4.596 €
#3	T1	61 m²	203.500 €	3.336 €	+6,75%	3.561 €
#4	T1	84 m²	265.000 €	3.155 €	+2,5%	3.234 €
Média				**4.489 €**		**3.949 €**

Valor de venda alvo conservador: T3 = 290.000 € · T1 = 210.000 € · Total = 500.000 €

AVALIAÇÃO AUTOMATIZADA ALFREDO.IA — VALOR DE MERCADO ESTIMADO

A plataforma Alfredo.ia efectuou uma avaliação automatizada do imóvel com base nos dados de mercado actualizados a Abril de 2026, confirmando os valores de referência utilizados no estudo comparativo.

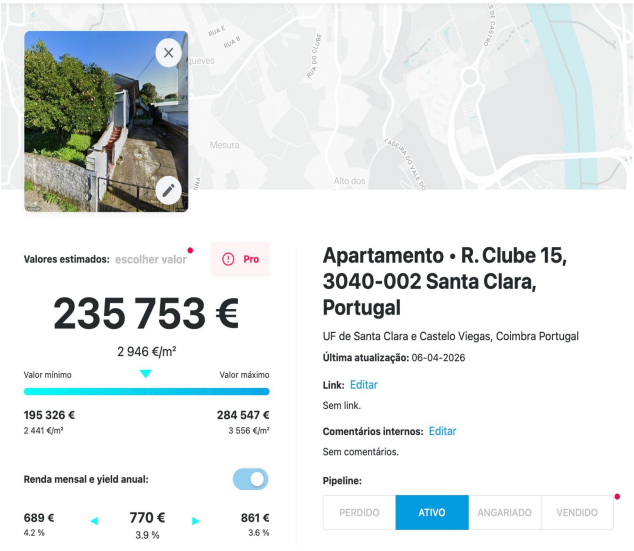

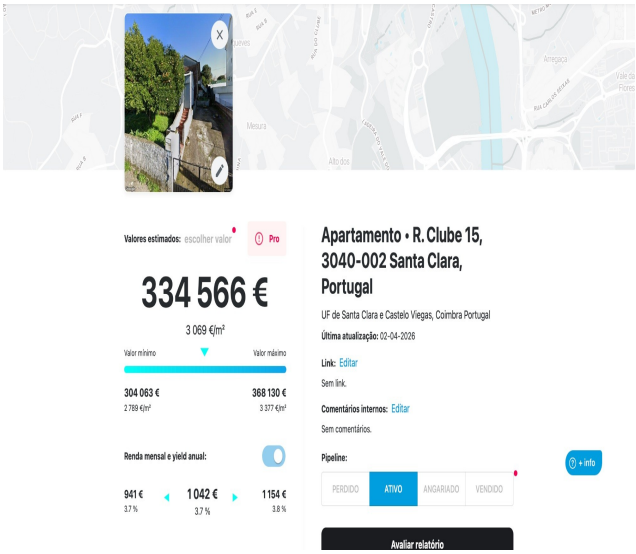

T1 — R/C · Avaliação Alfredo.ia: 235.753 € · 2.946 €/m² · Renda estimada: 770 €/mês | T3 — 1.º Andar · Avaliação Alfredo.ia: 334.566 € · 3.069 €/m² · Renda estimada: 1.042 €/mês

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO ALFREDO.IA

	T1 — R/C	T3 — 1.º Andar	Total do Imóvel
Valor Estimado (central)	**235.753 €**	**334.566 €**	**570.319 €**
Valor mínimo	195.326 €	304.063 €	499.389 €
Valor máximo	284.547 €	368.130 €	652.677 €
Preço/m² estimado	2.946 €/m²	3.069 €/m²	—
Renda mensal estimada	770 €/mês	1.042 €/mês	**1.812 €/mês**
Yield anual bruta	3,9%	3,7%	—

O valor de venda alvo definido para este projecto (500.000 €: T3 290.000 € + T1 210.000 €) é **conservador face à avaliação central do Alfredo.ia** (570.319 €), representando um desconto de 12,3% sobre o valor de mercado estimado. Esta margem confere segurança adicional ao investimento.

Síntese do Orçamento de Obra

Análise elaborada pelo Gestor de Obra da Somnium Properties · Santa Clara, Rua do Clube

CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA EFEITOS DE OBRA

R/C (T1)	Área bruta privativa: 55 m² · 2 quartos (~9 m² cada) · 1 casa de banho (~3,5 m²) · cozinha · sala
1.º Andar (T3)	Área bruta privativa: 55 m² + 40 m² supostos (legalidade a confirmar) · 2 quartos (~9 m²) · 1 quarto de maiores dimensões (~20 m²) · corredor · dispensa · cozinha · sala
Exterior	Edificado em madeira e chapas metálicas (~40 m²) na frente da habitação — necessita demolição antes do início da obra

PLANTAS TEÓRICAS — GESTOR DE OBRA

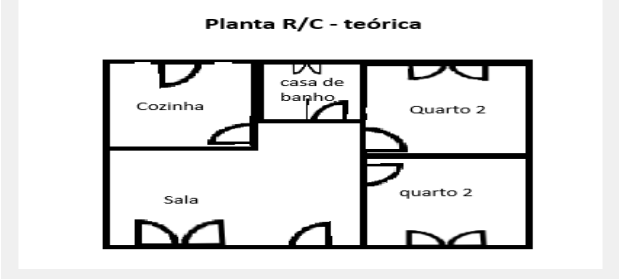

Planta R/C (Teórica) · T1 · 55 m²

Planta 1.º Andar (Teórico) · T3 · 55 m² + 40 m² supostos

MAPA DE CUSTOS DETALHADO (C/ IVA)

Categoria de Trabalho	Custo c/ IVA	Detalhe
Demolições e Limpeza	**3.695 €**	Demolição do edificado exterior, remoção de entulhos, nivelamento e limpeza geral interior e exterior
Electricidade e Canalização	**11.632 €**	Custo médio 70 €/m² · R/C: 55 m² → 4.735 € · 1.º Andar: 95 m² → 8.190 €
Pavimento Geral	**9.298 €**	Mosaico de 1.ª escolha rectificado + cola C2T1S1 + rejuntamento + MO 25 €/m² · R/C: 3.788 € · 1.º A: 6.543 €
Pladur Interior (Tetos)	**7.986 €**	Placa hidrófuga Knauf + lã mineral 60 mm + perfis + acabamentos · R/C: 3.382 € · 1.º A: 5.491 €
Caixilharias (Alumínio CT + Vidro Duplo)	**12.073 €**	R/C: 5 janelas + 1 WC → 4.401 € · 1.º A: 7 janelas + 1 WC → 6.061 € · Soleiras: 1.722 €
Sistema VMC (Ventilação Mecânica)	**12.150 €**	R/C: 5.000 € · 1.º Andar: 8.500 €
Pintura	**9.796 €**	R/C: 215 m² × 15 €/m² → 3.966 € · 1.º A: 375 m² × 15 €/m² → 6.918 €
Casas de Banho (× 3)	**10.800 €**	4.000 € por casa de banho com equipamentos completos
Portas Interiores (× 12)	**2.160 €**	175 €/unidade com aplicação incluída
Cozinhas (× 2)	**16.200 €**	9.000 €/cozinha · 4,5 m de comprimento · Electrodomésticos completos incluídos
Capoto Exterior	**12.785 €**	40 ml × 3,0 m → 8.118 € + 30 ml × 3,0 m → 6.088 € (55 €/m²)
Cobertura	**12.825 €**	95 m² × 150 €/m²
Total Estimado de Obra	**143.518 €**	Valor total com IVA, ajustado pelo gestor de obra. Parte da mão-de-obra em obras de reconstrução pode beneficiar de IVA a 6% (em vez de 23%), gerando poupança adicional.
Licenciamento (incluído)	**9.225 €**	Projecto de especialidade + arquitectura: 6.150 € · Taxas + solicitador: 3.075 € · **Já incluído no total de obra**

Nota do gestor de obra: *A análise considera a parte habitacional 100% legal e o 1.º andar como T3. Os 40 m² de área bruta independente (quarto de maiores dimensões, corredor e dispensa) têm legalidade a confirmar. Caso seja necessário licenciar parte do 1.º andar, o valor de licenciamento (9.225 €) já se encontra incluído no total de obra.*

ANÁLISE FINANCEIRA — CENÁRIO BASE

ESTRUTURA DE CUSTOS		RETORNOS	
Valor de Compra	**185.000 €**	Valor de Venda Alvo	**500.000 €**
IMT + Imposto de Selo	5.409 €	T3 (1.º Andar)	290.000 €
Escritura + Registos + CPCV	825 €	T1 (R/C)	210.000 €
Total Custos de Aquisição	**191.234 €**	**Lucro Estimado (Bruto)**	**147.493 €**
Obra + IVA (Orçamento Gestor)	143.518 €	IRC (20% sobre lucro)	29.499 €
Manutenção (12 meses)	2.280 €	**Lucro Estimado Líquido**	**117.994 €**
Comissão Imob. (2,5% + IVA)	15.375 €	Retorno Total Investimento	**41.8%**
CPCV de Venda	100 €	Retorno Cash-on-Cash	**43.8%**
Total Investido	**352.507 €**	**Retorno Anualizado**	**41.8%**

Pressupostos: *Financiamento: 100% capitais próprios · Manutenção mensal: 190 € (seguros 50 € + condomínio 40 € + electricidade 50 € + água 50 €) · Regime fiscal: Empresa · IRC 20% · Prazo: 12 meses desde a aquisição até à escritura de venda*

Análise de Sensibilidade — Stress Tests Individuais

Cada cenário altera uma única variável face ao cenário base, mantendo todas as restantes constantes.

VVR Base	Obra c/ IVA	Base	Total	alizado	o
500.000 €	**143.518 €**	**12 meses**	**41.8%**	**41.8%**	**117.994 €**

MODERADO Variação individual moderada — uma variável de cada vez

Cenário	VVR	Obra c/IVA	Meses	Lucro Bruto	Lucro Líq.	Ret. Total	CoC	Ret. Anual.	Var. RT %	Var. RA %
Base (Normal)	500.000 €	143.518 €	12 m	**147.493 €**	117.994 €	**41.8 %**	43.8 %	**41.8 %**	—	—
VVR –10% (450.000 €)	450.000 €	143.518 €	12 m	**99.030 €**	79.224 €	**28.2 %**	29.4 %	**28.2 %**	↓ **-13.6%**	↓ **-13.6%**
Obra +10% (157.870 €)	500.000 €	157.870 €	12 m	**133.141 €**	106.513 €	**36.3 %**	37.9 %	**36.3 %**	↓ **-5.5%**	↓ **-5.5%**
Retenção +3 meses (15 meses)	500.000 €	143.518 €	15 m	**146.923 €**	117.538 €	**41.6 %**	43.5 %	**32.1 %**	↓ **-0.2%**	↓ **-9.7%**

SEVERO Variação individual severa — uma variável de cada vez

Cenário	VVR	Obra c/IVA	Meses	Lucro Bruto	Lucro Líq.	Ret. Total	CoC	Ret. Anual.	Var. RT %	Var. RA %
Base (Normal)	500.000 €	143.518 €	12 m	**147.493 €**	117.994 €	**41.8 %**	43.8 %	**41.8 %**	—	—
VVR –20% (400.000 €)	400.000 €	143.518 €	12 m	**50.568 €**	40.454 €	**14.5 %**	15.0 %	**14.5 %**	↓ **-27.3%**	↓ **-27.3%**
Obra +20% (172.222 €)	500.000 €	172.222 €	12 m	**118.789 €**	95.031 €	**31.2 %**	32.5 %	**31.2 %**	↓ **-10.6%**	↓ **-10.6%**
Retenção +6 meses (18 meses)	500.000 €	143.518 €	18 m	**146.353 €**	117.082 €	**41.4 %**	43.3 %	**26.0 %**	↓ **-0.4%**	↓ **-15.8%**

Nota: O impacto individual mais crítico é a queda do VVR em –20%, que reduz o lucro líquido para 40.454 € e o retorno *total para 14.5%. O aumento de 20% no custo de obra e o prolongamento da retenção têm um impacto mais moderado.*

Análise de Sensibilidade — Stress Tests Combinados

Neste exercício, **todas as variáveis de risco são aplicadas em simultâneo**, representando os cenários de maior impacto combinado sobre o investimento.

VVR Base	Obra c/ IVA	Base	Total	alizado	o
500.000 €	**143.518 €**	**12 meses**	**41.8%**	**41.8%**	**117.994 €**

STRESS TEST MODERADO — TODOS OS CRITÉRIOS EM SIMULTÂNEO

STRESS **Stress Moderado Combinado**

Variáveis em simultâneo: *VVR –10% (500.000 € → 450.000 €) · Obra +10% (143.518 € → 157.870 €) · Retenção +3 meses (12 → 15 meses)*

VVR Aplicado	Obra c/ IVA		ido
450.000 €	**157.870 €**	**15 meses**	**67.286 €**

Indicador	Cenário Combinado	Base (Normal)	Variação (€)	Variação (%)
Cap. Próprios Necessários	**351.954 €**	337.032 €	↑ +14.922 €	↑ +14.922 €
Lucro Estimado (Bruto)	**84.108 €**	147.493 €	↓ -63.385 €	↓ -63.385 €
Lucro Estimado (Líq. IRC)	**67.286 €**	117.994 €	↓ -50.708 €	↓ -50.708 €
Retorno Total Investimento	**23.0%**	41.8%	—	↓ -18.8%
Retorno Cash-on-Cash	**23.9%**	43.8%	—	↓ -19.9%
Retorno Anualizado	**18.0%**	41.8%	—	↓ -23.8%

STRESS TEST SEVERO — TODOS OS CRITÉRIOS EM SIMULTÂNEO

STRESS **Stress Severo Combinado**

Variáveis em simultâneo: *VVR –20% (500.000 € → 400.000 €) · Obra +20% (143.518 € → 172.222 €) · Retenção +6 meses (12 → 18 meses)*

VVR Aplicado	Obra c/ IVA		ido
400.000 €	**172.222 €**	**18 meses**	**16.579 €**

Indicador	Cenário Combinado	Base (Normal)	Variação (€)	Variação (%)
Cap. Próprios Necessários	**366.876 €**	337.032 €	↑ +29.844 €	↑ +29.844 €
Lucro Estimado (Bruto)	**20.724 €**	147.493 €	↓ -126.769 €	↓ -126.769 €
Lucro Estimado (Líq. IRC)	**16.579 €**	117.994 €	↓ -101.415 €	↓ -101.415 €
Retorno Total Investimento	**5.5%**	41.8%	—	↓ -36.3%
Retorno Cash-on-Cash	**5.6%**	43.8%	—	↓ -38.2%
Retorno Anualizado	**3.6%**	41.8%	—	↓ -38.2%

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

O projecto apresenta um perfil de risco-retorno atractivo: no cenário base conservador, o investimento gera um retorno total de 41.8% e anualizado de 41.8% num prazo de 12 meses. No cenário moderado combinado, o lucro líquido é de 67.286 € com retorno de 23.0%. No cenário severo combinado — o pior caso possível com todas as adversidades em simultâneo — o lucro líquido cai para 16.579 € e o retorno para apenas **5.5%. O investimento mantém lucro positivo mesmo no pior cenário, o que valida a solidez estrutural do** projecto. A localização em Santa Clara, Coimbra, com forte procura de arrendamento universitário e crescente interesse de compra, sustenta os valores de venda projectados.
